



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia

INFORME TÉCNICO PLAN DE ACCIÓN 2026

“JUNTOS CONSTRUIMOS 2024-2027”

LÍNEA ESTRATÉGICA: 05. juntos por el medio ambiente, la prevención y atención de emergencias y desastres y la dignificación del campo Guatapense.

COMPONENTE: 0501. Junto por la Prestación de Servicios Públicos de calidad

PERIODO A REPORTAR: Enero, febrero, marzo de 2026

PROGRAMA: Gestión para la ampliación y optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas PTARD del municipio de Guatapé

INTRODUCCIÓN:

Guatapé, reconocido por su riqueza natural, su valor turístico y su importancia ambiental dentro del oriente antioqueño, enfrenta actualmente serios retos en la gestión adecuada de las aguas residuales generadas por la población residente y flotante; el alto crecimiento de la población y el desarrollo turístico, ha desbordado la capacidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios del municipio, razón por la cual se realizó en el año 2021 la actualización del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, en el cual se definieron las nuevas obras de infraestructura necesarias para alcanzar una óptima prestación de los servicios públicos dentro de los parámetros de calidad, continuidad y eficiencia.

Dentro de las obras planteadas en el plan maestro, para la prestación del servicio público de alcantarillado se encuentra la construcción de nuevas redes y colectores, así como la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales, debido a que la existente no cuenta con la capacidad hídrica y no cumple con la normatividad ambiental. Gracias a las gestiones realizadas y con el apoyo de entidades como CORNARE y la Gobernación de Antioquia, ya se ha avanzado de manera significativa en la construcción de los colectores y nuevas redes, por lo que en un nuevo esfuerzo se busca la construcción de la primera etapa de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

La carencia de una infraestructura moderna para el tratamiento de las aguas residuales ha ocasionado impactos negativos en fuentes hídricas como el embalse El Peñol-Guatapé y otros cuerpos de agua que son fundamentales para el equilibrio ecológico y el bienestar de la población. Esta situación representa una amenaza para la salud pública, el medio ambiente y el desarrollo turístico sostenible del municipio. De igual forma, se configura como un incumplimiento de las normas



Dirección:

Calle 31 # 30 - 08
Parque Principal
Código postal: 053840



Contacto:

+57 604 861 05 55



Sitio web:

www.municipiodeguatape.gov.co
NIT 890 983 830 - 3



@alcguatape



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia

ambientales nacionales que exigen el tratamiento de las aguas residuales antes de su disposición final.

Con este proyecto se plantea la construcción de la primera fase de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales del casco urbano del municipio de Guatapé, y así ampliar la cobertura del sistema de alcantarillado existente que presenta problemas de capacidad hidráulica por el alto incremento de la población residente y flotante del municipio por su vocación turística, por lo que se hace necesario fortalecer el sistema existente; lográndose así, dar cobertura, atender e impactar la población del municipio.

OBJETIVO: Mejorar las condiciones de saneamiento urbano a través de la ampliación y optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Guatapé.

PROYECTO ASOCIADO: 202500000040583

INDICADOR DE PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO:

Código del producto	Indicador de producto	Unidad de medida	Tendencia	Línea de Base	Meta Cuatrienio	Meta 2026	Meta Ejecutada
400300801	Proyectos de aguas residuales apoyados financieramente	Número	Incremento	0	1	0.5	1

ACTIVIDADES EJECUTADAS PLAN DE DESARROLLO:

Durante el primer trimestre del año 2026 se desarrollaron las siguientes actividades en el marco del proyecto:

- **Localización y replanteo de estructuras:** Se realizó la identificación en campo y el replanteo técnico de las áreas destinadas a la construcción de la PTAR, garantizando precisión en la ejecución de las obras.



Dirección:
Calle 31 # 30 - 08
Parque Principal
Código postal: 053840



Contacto:
+57 604 861 05 55




Sitio web:
www.municipiodeguatape.gov.co
NIT 890 983 830 - 3



@alcguatape



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia

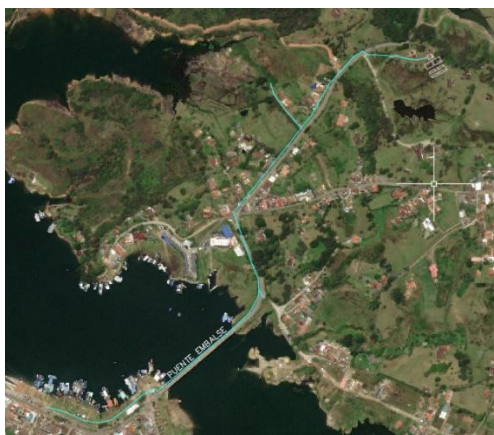

- **Actas de vecindad y entorno:** Se adelantó el levantamiento de actas de vecindad, con el fin de registrar el estado inicial de las zonas aledañas al proyecto, mitigando posibles conflictos durante la ejecución de las obras.
- **Alistamiento de personal:** Se cuenta con el personal técnico y operativo necesario para el inicio de la fase constructiva, específicamente para la ejecución de las pilas de cimentación.

ANÁLISIS DEL AVANCE Y OBSERVACIONES

Durante el primer trimestre de 2026 (enero, febrero y marzo), el proyecto asociado a la ampliación y optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas (PTARD) del municipio de Guatapé presenta un avance satisfactorio en su fase preconstructiva, conforme a lo programado en el Plan de Acción 2026.

Las actividades ejecutadas corresponden principalmente a la preparación técnica, social y operativa del proyecto, necesarias para garantizar el inicio adecuado de la fase constructiva

EVIDENCIAS:

- Convenio



Dirección:
Calle 31 # 30 - 08
Parque Principal
Código postal: 053840



Contacto:
+57 604 861 05 55



Sitio web:
www.municipiodeguatape.gov.co
NIT 890 983 830 - 3



@alcguatape



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PLAN DE ACCIÓN

1. Construcción de la primera Fase de la Planta de Tratamiento en el Sector el Roble.

NOMBRE DEL INDICADOR	META PROGRAMADA 2026	META EJECUTADA - TRIMESTRES			
		1	2	3	4
Infraestructura construida	1	0			

ACTIVIDADES EJECUTADAS PLAN DE ACCIÓN:

Durante el primer trimestre de 2026 se ejecutaron las siguientes actividades correspondientes a la fase inicial del proyecto:

- **Localización y replanteo del proyecto:** Se realizó la identificación técnica en campo del área de intervención, asegurando la correcta ubicación de las obras conforme a los diseños aprobados.
- **Implantación de estructuras en el terreno:** Se efectuó la marcación y verificación de puntos de referencia para la futura construcción de la infraestructura, garantizando la coherencia entre el diseño y la ejecución en sitio.
- **Preparación de socialización del proyecto:** Se avanzó en la organización de las actividades de socialización dirigidas a la comunidad del área de influencia, con el fin de informar el alcance del proyecto, sus beneficios y posibles impactos durante la etapa constructiva.

2. Formulación proyecto de la segunda Fase para la construcción de planta de Tratamiento en el sector el Roble.

NOMBRE DEL INDICADOR	META PROGRAMADA 2026	META EJECUTADA - TRIMESTRES			
		1	2	3	4
Proyecto Formulado	1	0			

Para esta actividad no se han presentado avances durante este periodo



Dirección:
Calle 31 # 30 - 08
Parque Principal
Código postal: 053840



Contacto:
+57 604 861 05 55



Sitio web:
www.municipiodeguatape.gov.co
NIT 890 983 830 - 3



@alcguatape



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia

ANÁLISIS DEL AVANCE Y OBSERVACIONES

Durante el primer trimestre de 2026, el programa de Gestión para la ampliación y optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas (PTARD) del municipio de Guatapé presenta un avance coherente con la fase de ejecución en la que se encuentra el proyecto, evidenciando principalmente desarrollo de actividades preliminares y de alistamiento técnico, social y operativo.

En el componente de construcción de la primera fase de la PTAR en el sector El Roble, las actividades ejecutadas corresponden a la etapa preconstructiva, orientada a garantizar las condiciones necesarias para el inicio de la obra civil. Se destacan la localización y replanteo del proyecto, la implantación de estructuras en terreno y la preparación de la socialización con la comunidad del área de influencia. Estas acciones permiten asegurar la correcta ejecución técnica y la adecuada articulación con los actores sociales del territorio.

En relación con el indicador de infraestructura construida, la meta ejecutada a la fecha se mantiene en cero (0), lo cual es consistente con la programación del cronograma de obra, dado que el periodo reportado corresponde a actividades previas al inicio de la fase constructiva.

Por otra parte, en el componente de formulación de la segunda fase del proyecto de la PTAR, no se registran avances durante el periodo evaluado, debido a que las acciones se encuentran en proceso de planificación y dependen del desarrollo de insumos técnicos, administrativos y financieros para su estructuración.

CONCLUSIONES GENERALES:

Teniendo en cuenta que el indicador del Plan de Desarrollo es “Proyectos de aguas residuales apoyados financieramente”, las actividades ejecutadas durante el primer trimestre de 2026 contribuyen de manera directa al cumplimiento de dicho indicador, en la medida en que permiten la materialización y continuidad del proyecto de ampliación y optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas (PTARD) del municipio de Guatapé.

En este sentido, las acciones adelantadas en la fase preconstructiva —como la localización y replanteo del proyecto, la implantación de estructuras en terreno, las actas de vecindad y el alistamiento del personal técnico y operativo— evidencian la ejecución efectiva de recursos financieros previamente gestionados y asignados, lo cual se traduce en el avance real del proyecto financiado.

**Dirección:**

Calle 31 # 30 - 08
Parque Principal
Código postal: 053840

**Contacto:**

+57 604 861 05 55

**Sitio web:**

www.municipiodeguatape.gov.co
NIT 890 983 830 - 3



@alcguatape



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia

CONTRATACIÓN:

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO	VALOR TOTAL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 793-2025 CORNARE - MUNICIPIO	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el sector El Roble, como componente fundamental en la implementación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, del área urbana del municipio de Guatapé. Fase 1	\$ 2.325.038.743.



Dirección:
Calle 31 # 30 - 08
Parque Principal
Código postal: 053840



Contacto:
+57 604 861 05 55



Sitio web:
www.municipiodeguatape.gov.co
NIT 890 983 830 - 3



@alcguatape
